ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea : " PROGRAMULUI DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA LUNECUŞULUI ŞI ÎNZĂPEZIRII PE DRUMURILE JUDEŢENE DIN JUDEŢUL ILFOV PE PERIOADA TIMPULUI NEFAVORABIL SPECIFIC IERNII 2016 - 2017"

JUDEŢUL ILFOV - CONSILIUL JUDEŢEAN, întrunit în ședința ordinară în data de 08.08.2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr 7486 din 18.07.016;

- Raportul Direcţiei Investiții, Serviciul Lucrări Publice și Achiziții, înregistrat cu nr. 7487 din 18.07.2016.

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997-privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, Sectiunea 5, art. 9, lit. b,

Tinând cont de prevederile Ordinului nr. 289/2170/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013 şi Instrucţiuni privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii – indicativ AND 525 – 2013.

În temeiul art.91 alin.(1) şi f), precum şi art. 97 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice, republicată, modificată şi completată,

H O T A R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aprobă "Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV, pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 ÷ 2017", conform anexelor nr. 1 – 7, program care se va materializa prin încheierea unui contract, pentru iarna 2016 – 2017.

Art.2. – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura îndeplinirea măsurilor prevăzute în program.

Art.3. – Directia Juridică şi Administratie Publică Locală va comunica prezenta Hotarâre către Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Codrii Vlăsiei" al Judeţului Ilfov, Electrica Ilfov, Autoritatea Metropolitană de Transport Ilfov şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti.

PREŞEDINTE
Marian PETRACHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica TRANDAFIR

Nr. 69

Din 08.08.2016

Anexa 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov
nr..... din data 2016

COORDONARE GENERALĂ
PREŞEDINTE
TEL.: 021.212.56.98

COORDONARE
VICEPREŞEDINŢI
TEL.:021.212.57.00

COMANDAMENT
Numit de Preşedinte , prin dispoziţie, Tel.: 021.212.75.34

- Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov Tel:021.311.28.62
- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov Tel: 021.232.98.30; 021.233.98.50 fax Brigada Poliţiei Rutiere Tel : 021.232.98.35 fax
- Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului Ilfov Tel:021.252.84.06 021.252.01.22 fax
- R.A.T.B. Tel : 021.314.78.77
- I.N.M.H. Tel. : 021.231.37.32
- S.C. ENEL Distributie Muntenia zona de retea medie tensiune, joasa tensiune Tel. : 0372.115.413 Lungu Gheorghe
- Serviciul public de intretinere drumuri judetene Tel. . 021.212.75.39

ANEXA 2
la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov
nr..... din data 2016

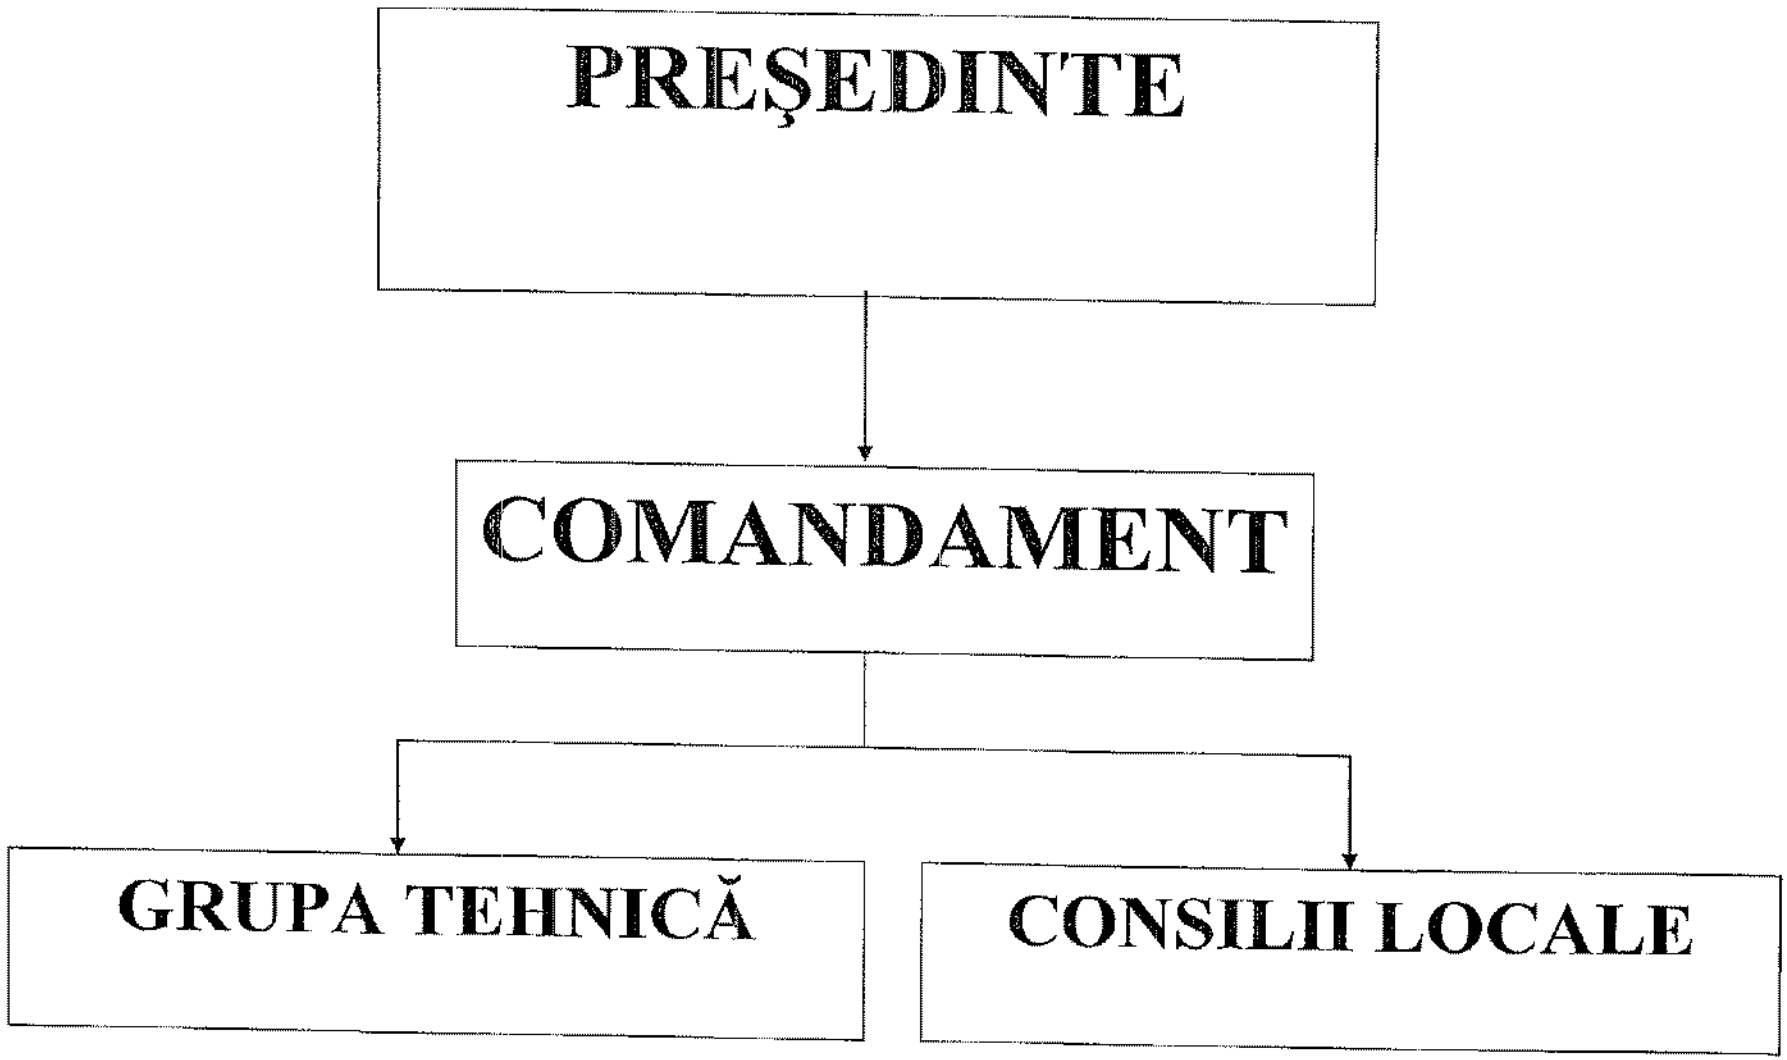

ANEXA 3
la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov
nr..... din data 2016

GRUPA TEHNICĂ
Pentru apărare împotriva înzăpezirii, viscolului şi poleiului

Nr. crt.	Nume şi prenume	Locul de muncă	Funcţia	Telefoane	
				serviciu	acasă
1.	Călinoiu Constantin	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Director Executiv,	021.212.75.39	
2.	Radu Mărioara	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Sef Serviciu	0722.579.584	
3.	Bită Nicolae	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Sef Serviciu	0744.363.646	
4.	Radu Cojocar	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Referent	0743.642.074	
5.	Igna Mircea	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Consilier	021.212.75.39	
6.	Viorel Opariuc	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Consilier	0720.034.927	
7.	Columb Florian	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Consilier	0735.839.065	
8.	Andrei Bârlad	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Consilier	0722.327.229	
9.	George Dincă	Judetul Ilfov – Consiliul Judetean	Consilier	0729.892.796	

ANEXA 4
la Hotărârea Consiliul Județean Ilfov

nr. ..... din data 2016

PROPUNERI BAZE

privind ,,Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi inzapezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific unei iernii calendaristice, respectiv 15.Noiembrie.2016 - 15.Martie.2017

BAZA 1			
Drum	**Denumire Drum**	**Sector drum**	**Lungime -km-**
DJ 181	(DC 181) DN 1 - Manastirea Tiganesti	0+000 - 3+500	3,500
DJ 101	Buftea-Tamaşi-Corbeanca-Baloteşti (DJ 200B)	0+000 - 16+200	16,200
DJ 101 A	Corbeanca-Ostratu	0+000 - 3+000	3,000
	Peris - Limita Judet Dambovita	11+900 - 14+000	2,100
DJ 101 B	Periş-Tâncăbeşti-Vlădiceasca-Ciofliceni-Ghermăneşti-Snagov-Gruiu	8+000 - 34+000	26,000
DJ 101 C	DN 1-Siliştea Snagovului-Sanţu Floreşti-Gruiu	0+000 - 10+820	10,820
DJ 110 H	Siliştea Snagovului	0+000 - 3+700	3,700
DJ 110 J	Complex Astoria	0+000 - 2+100	2,100
DJ 200 B	DJ 101, Balotesti - DN 1, Saftica	18+800 - 25+100	6,300
DJ 101 N	Ciolpani - Izvorani	0+000 - 3+100	3,100
DJ 111	Snagov Palat - Izvorani	0+000 - 3+237	3,237
DJ 602	limita jud.Giurgiu - DN7 - DN 1A	34+000 - 40+000	6,000
DJ 179	Peris (DJ 101 B) - Balteni - Burias - limita judet Dambovita	0+000 - 9+475	9,475
DJ 602 A	DJ 602 - limita judet Dambovita	0+000 - 4+000	4,000
	sare = 44,789 to x 25 treceri = 1.119,725 to	**597.192 mp**	**95,532 km**
	nisip = 76,782 mc x 25 treceri = 1.919,550 mc		

CONSUMURI LUATE IN CALCUL LA O TRECERE / 25 TRECERI:
75 g sare/mp x 597.192 mp x 25 treceri = 1.119.735 kg sare
225 g nisip/mp x 597.192 mp x 25 treceri = 3.359.205 kg nisip
1 mc nisip = 1.750 kg nisip
3.359.205 kg nisip / 1.750 kg/mc = 1.919,545 mc nisip

BAZA 2			
Drum	Denumire Drum	Sector drum	Lungime -km-
DJ 100	Otopeni - Tunari - Stefanesti	3+000 - 12+200	9,200
DJ 101	Baloteşti (DJ 200B)-Căciulati-M.Vlăsiei-Grădistea-Sitaru	16+200 - 37+600	21,400
DJ 101 B	Gruiu (DJ 101C)-Lipia-Nuci-M.Pechii-limita judeţ Ialomita	34+000 - 47+000	13,000
DJ 101 C	Lipia-DJ 101	14+500 - 20+850	6,350
DJ 101 J	Sitaru - Manastirea Sf.Nic.Balamucea	0+000 - 1+500	1,500
DC 184	Dascălu-M.Vlăsiei	0+000 - 6+045	6,045
DJ 200	Gagu-Grădistea	19+500 - 27+000	7,500
DJ 200 B	Centura Bucureşti-Dimieni-DJ 101	8+800 - 18+800	10,000
DJ 101 D	Caciulati (DJ 101) - Unitatea Militara	0+000 - 1+500	1,500
	sare = 34,423 to.x 25 treceri = 860,575 to	**458.970 mp**	**76,495 km**
	nisip = 59,010 mc x 25 treceri = 1.475,250 mc		

CONSUMURI LUATE IN CALCUL LA O TRECERE / 25 TRECERI:
75 g sare/mp x 458.970 mp x 25 treceri = 860.568.750 kg sare
225 g nisip/mp x 458.970 mp x 25 treceri = 2.581.706 kg nisip
1 mc nisip = 1.750 kg nisip
2.581.706 kg nisip / 1.750 kg/mc = 1.475,261 mc nisip

BAZA 3			
Drum	Denumire Drum	Sector drum	Lungime -km-
DJ 100	Stefăneşti-Găneasa	12+220 - 22+000	9,780
DJ 200	Centura Bucureşti - Gagu	6+200 - 19+500	13,300
DJ 200 A	Afumaţi-Petrăchioaia	0+000 - 8+060	8,060
DJ 300	Pantelimon-M.Domnească-Şindrilita	3+000 - 10+500	7,500
DJ 402	Măineasca-Gagu	59+550 - 71+000	11,450
DC 27	DN 2 - Moara Domnească	0+000-4+000	4,000
	sare = 24,341 to x 25 treceri = 608,525 to	**324.540 mp**	**54,090 km**
	nisip = 41,727 mc x 25 treceri = 1.043,175 mc		

CONSUMURI LUATE IN CALCUL LA O TRECERE / 25 TRECERI:
75 g sare/mp x 324.540 mp x 25 treceri = 608.512 kg sare

225 g nisip/mp x 324.540 mp x 25 treceri = 1.825.537 kg nisip
1 mc nisip = 1.750 kg nisip
1.825.537 kg nisip / 1.750 kg/mc = 1.043,164 mc nisip

BAZA 4			
Drum	Denumire Drum	Sector drum	Lungime -km-
DJ 100	Găneasa-Cozieni-Brăneşti-Vadul Anei	22+000 - 35+000	13,000
DJ 301	Pantelimon-Cernica-Tânganu	0+000 - 13+000	13,000
DJ 301 A	Glina-Bălăceanca-Poşta	0+000 - 9+200	9,200
DJ 301 B	DN 3-Pasărea-Piteasca	0+000 - 4+500	4,500
DC 55	Cernica - Bălăceanca	0+000 - 3+500	3,500
sare = 19,440 to x 25 treceri = 486,000 to		259.200 mp	43,200 km
nisip = 33,325 mc x 25 treceri = 833,125 mc			

CONSUMURI LUATE IN CALCUL LA O TRECERE / 25 TRECERI:
75 g sare/mp x 259.200 mp x 25 treceri = 486.000 kg sare
225 g nisip/mp x 259.200 mp x 25 treceri = 1.458.000 kg nisip
1 mc nisip = 1.750 kg nisip
1.458.000 kg nisip / 1.750 kg/mc = 833,143 mc nisip

BAZA 5			
Drum	Denumire Drum	Sector drum	Lungime -km-
DJ 401	Centura Bucureşti - Berceni - Vidra	6+500 - 19+000	12,500
DJ 401 A	Vidra-Sinteşti-Jilava-Măgurele-Bragadiru	0+000 - 21+550	21,550
DJ 401 D	Dărăsti Ilfov -1 Decembrie - Vidra	0+000 - 14+360	14,360
DJ 400	(DC 101) Magurele - Alunisu - Dărăşti Ilfov	0+000 - 4+500	4,500
DC 18	Bucureşti - Măgurele	0+000 - 7+500	7,500
sare = 27,185 to x 25 treceri = 679,625 to		362.460 mp	60,410 km
nisip = 46,602 mc x 25 treceri = 1.165,050 mc			

CONSUMURI LUATE IN CALCUL LA O TRECERE / 25 TRECERI:
75 g sare/mp x 362.460 mp x 25 treceri = 679.612 kg sare

225 g nisip/mp x 362.460 mp x 25 treceri = 2.038.837 kg nisip
1 mc nisip = 1.750 kg nisip
2.038.837 kg nisip / 1.750 kg/mc = 1.165,050 mc nisip

BAZA 6			
Drum	Denumire Drum	Sector drum	Lungime -km-
DJ 401 A	Bragadiru (DN6)-Clinceni-Domneşti	21+550 - 27+750	6,200
	Darvari - limită judeţ Giurgiu	31+350 - 32+350	1,000
DJ 601	Autostrada A1-Ciorogarla-limita judet Giurgiu	0+000 - 7+000	7,000
DJ 601 A	Roşu - Chiajna - Dragomireşti	0+500 - 11+500	11,000
DJ 602	Centura Bucureşti - Domneşti	5+000 - 21+950	16,950
DJ 143	(DC 143) Dragomireşti Deal + Dragomireşti Vale - Zurbaua	0+000 - 4+970	4,970
		282.720 mp	47,120 km

sare = 21,204 to x 25 treceri = 531,100 to
nisip = 36,350 mc x 25 treceri = 908,750 mc

CONSUMURI LUATE IN CALCUL LA O TRECERE / 25 TRECERI:
75 g sare/mp x 282.720 mp x 25 treceri = 530.100 kg sare
225 g nisip/mp x 282.720 mp x 25 treceri = 1.590.300 kg nisip
1 mc nisip = 1.750 kg nisip
1.590.300 kg nisip / 1.750 kg/mc = 908,743 mc nisip

ANEXA 5
la Hotărârea Consiliului
Judeţean Ilfov
nr. ..... din data 2016

Necesar utilaje/ asistenta tehnica privind „Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi inzapezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific unei iernii calendaristice, respectiv 15.Noiembrie.2016 - 15.Martie.2017

BAZA 1						
Nr. crt.	Denumire utilaj	Bucati	Consum (l / ora)		Total consum ore functionare	
			combustibil	lubrefiant	combustibil	lubrefiant
1	Autogreder	2	12,50	0,50	8.125,00	325,00
2	Buldozer pe senile	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
3	Incarcator frontal	4	7,00	0,50	9.100,00	650,00
4	Freză zăpadă	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
5	Autobasculanta cu lama şi sărăriţă	7	12,50	0,50	28.437,50	1.137,50
6	Asistenta tehnica	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
Total la 325 ore functionare (13 ore/trecere)		**16**	**69,50**	**3,00**	**57.850,00**	**2.600,00**

25 TRECERI A CATE 13 ORE/TRECERE = 325 ORE

Lungime drumuri **99,532 km**
Suprafata **597.192 mp**

BAZA 2						
Nr. crt.	Denumire utilaj	Bucati	Consum (l / ora)		Total consum ore functionare	
			combustibil	lubrefiant	combustibil	lubrefiant
1	Autogreder	2	12,50	0,50	8.125,00	325,00
2	Buldozer pe senile	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
3	Incarcator frontal	4	7,00	0,50	9.100,00	650,00
4	Autobasculanta cu lama şi sărăriţă	6	12,50	0,50	24.375,00	975,00
5	Asistenta tehnica	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
Total la 325 ore functionare (13 ore/trecere)		**14**	**57,00**	**2,50**	**49.725,00**	**2.275,00**

25 TRECERI A CATE 13 ORE/TRECERE = 325 ORE

Lungime drumuri **76,495 km**

Suprafata **458.970 mp**

BAZA 3						
Nr. crt.	Denumire utilaj	Bucati	Consum (l / ora)		Total consum ore functionare	
			combustibil	lubrefiant	combustibil	lubrefiant
1	Autogreder	2	12,50	0,50	8.125,00	325,00
2	Buldozer pe senile	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
3	Incarcator frontal	3	7,00	0,50	6.825,00	487,50
4	Freză zăpadă	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
5	Autobasculanta cu lama şi sărăriţă	5	12,50	0,50	20.312,50	812,50
6	Asistenta tehnica	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
Total la 325 ore functionare (13 ore/trecere)		**13**	**69,50**	**3,00**	**47.450,00**	**2.112,50**

25 TRECERI A CATE 13 ORE/TRECERE = 325 ORE

Lungime drumuri **54,09 km**

Suprafata **324.540 mp**

BAZA 4						
Nr. crt.	Denumire utilaj	Bucati	Consum (l / ora)		Total consum ore functionare	
			combustibil	lubrefiant	combustibil	lubrefiant
1	Autogreder	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
2	Buldozer pe senile	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
3	Incarcator frontal	2	7,00	0,50	4.550,00	325,00
4	Autobasculanta cu lama şi sărăriţă	4	12,50	0,50	16.250,00	650,00
5	Asistenta tehnica	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
Total la 325 ore functionare (13 ore/trecere)		**9**	**57,00**	**2,50**	**32.987,50**	**1.462,50**

25 TRECERI A CATE 13 ORE/TRECERE = 325 ORE

Lungime drumuri **43,2 km**

Suprafata **259.200 mp**

BAZA 5						
Nr. crt.	Denumire utilaj	Bucati	Consum (l / ora)		Total consum ore functionare	
			combustibil	lubrefiant	combustibil	lubrefiant
1	Autogreder	2	12,50	0,50	8.125,00	325,00
2	Buldozer pe senile	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
3	Incarcator frontal	3	7,00	0,50	6.825,00	487,50
4	Autobasculanta cu lama şi sărăriţă	5	12,50	0,50	20.312,50	812,50
5	Asistenta tehnica	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
Total la 325 ore functionare (13 ore/trecere)		**12**	**57,00**	**2,50**	**43.387,50**	**1.950,00**

25 TRECERI A CATE 13 ORE/TRECERE = 325 ORE

Lungime drumuri **60,41 km**

Suprafata **362.460 mp**

BAZA 6						
Nr. crt.	Denumire utilaj	Bucati	Consum (l / ora)		Total consum ore functionare	
			combustibil	lubrefiant	combustibil	lubrefiant
1	Autogreder	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
5	Buldozer pe senile	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
2	Incarcator frontal	2	7,00	0,50	4.550,00	325,00
3	Autobasculanta cu lama şi sărăriţă	4	12,50	0,50	16.250,00	650,00
6	Asistenta tehnica	1	12,50	0,50	4.062,50	162,50
Total la 325 ore functionare (13 ore/trecere)		**9**	**57,00**	**2,50**	**32.987,50**	**1.462,50**

25 TRECERI A CATE 13 ORE/TRECERE = 325 ORE

Lungime drumuri **47,12 km**

Suprafata **282.720 mp**

ANEXA 6
la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov

nr. ..... din data 2016

DEVIZ ESTIMATIV
DESZAPEZIRE 2016 -2017
BAZA 1, 99,532 km.

DENUMIRE	BUC.	CANT.	P/U	MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7
1 AUTOGREDER							
- ORE FUNCTIONARE	2	650,00	110,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
2 BULDOZER PE SENILE							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	110,00	0,00	0,00	35 750,00	35.750,00
3 INCARCATOR FRONTAL							
- ORE FUNCTIONARE	4	1.300,00	80,00	0,00	0,00	104 000,00	104.000,00
- ORE STATIONARE		1.008,00	16,00	0,00	0,00	16.128,00	16.128,00
4 FREZA ZAPADA							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	100,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
5 AUTOBASCULANTA CU LAMA SI SARARITA							
- ORE FUNCTIONARE	7	2 275,00	100,00	0,00	0,00	227 500,00	227.500,00
- ORE STATIONARE		1.764,00	20,00	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00
6 ASISTENTA TEHNICA							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	80,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
6 SARE (to)		1.119,730	225,00	251.939,25			251.939,25
7 NISIP (mc)		1.919,550	40,00	76.782,00			76.782,00
TOTAL CHELTUIELI				328.721,25	0,00	548.658,00	877.379,25

		Material	Manopera	Utilaj	Total
TOTAL		328.721,25	0,00	548.658,00	877.379,25
		MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
TOTAL CHELT DIRECTE I		328.721,25	0,00	548.658,00	877.379,25
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
C A S	300%				0
Acc munca, boli prof	242%				0
C.A.S.S.	200%				0
AJUTOR SOMAJ	500%				0
CCI	350%				0
Camera de munca	250%				0
Fond garantare	250%				0
TOTAL CHELT DIRECTE II		328.721,25	0,00	548.658,00	877.379,25
TOTAL INDIRECTE+PROFIT					89 931,37
DIN CARE :					
CHELTUIELI INDIRECTE	5,000%				43.868,96
PROFIT	5,000%				46 062,41
TOTAL					967.310,62
T V A 20 %					193 462,12
TOTAL CU TVA					1.160.772,75

DEVIZ ESTIMATIV
DESZAPEZIRE 2016 -2017
BAZA 2, 76,495 km

DENUMIRE	BUC.	CANT.	P/U	MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7
1 AUTOGREDER							
- ORE FUNCTIONARE	2	650,00	110,00	0,00	0,00	71.500,00	**71.500,00**
2 BULDOZER PE SENILE							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	110,00	0,00	0,00	35.750,00	**35.750,00**
3 INCARCATOR FRONTAL							
- ORE FUNCTIONARE	4	1.300,00	80,00	0,00	0,00	104.000,00	**104.000,00**
- ORE STATIONARE		1.008,00	16,00	0,00	0,00	16.128,00	**16.128,00**
4 AUTOBASCULANTA CU LAMA SI SARARITA							
- ORE FUNCTIONARE	6	1.950,00	100,00	0,00	0,00	195.000,00	**195.000,00**
- ORE STATIONARE		1.512,00	20,00	0,00	0,00	30.240,00	**30.240,00**
5 ASISTENTA TEHNICA							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	80,00	0,00	0,00	26.000,00	**26.000,00**
6 SARE (to)		860,580	225,00	193.630,50			193.630,50
7 NISIP (mc)		1.475,250	40,00	59.010,00			59.010,00
TOTAL CHELTUIELI				**252.640,50**	**0,00**	**478.618,00**	**731.258,50**

		Material	Manopera	Utilaj	Total
TOTAL		**252.640,50**	**0,00**	**478.618,00**	**731.258,50**
		MATER	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
TOTAL CHELT.DIRECTE I		**252.640,50**	**0,00**	**478.618,00**	**731.258,50**
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
C.A.S	500%				0
Acc.munca, boli prof	242%				0
C.A.S.S.	200%				0
AJUTOR SOMAJ	500%				0
CCI	850%				0
Camera de munca	250%				0
Fond garantare	250%				0
TOTAL CHELT DIRECTE II		**252.640,50**	**0,00**	**478.618,00**	**731.258,50**
TOTAL INDIRECTE+PROFIT					74 954,00
DIN CARE :					
CHELTUIELI INDIRECTE	5,000%				36.562,93
PROFIT	5,000%				38 391,07
TOTAL					**806.212,50**
T.V.A. 20 %					161.242,50
TOTAL CU TVA					**967.455,00**

DEVIZ ESTIMATIV
DESZAPEZIRE 2016 -2017
BAZA 3, 54,090 km.

DENUMIRE	BUC.	CANT.	P/U	MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7
1 AUTOGREDER							
- ORE FUNCTIONARE	2	650,00	110,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
2 BULDOZER PE SENILE							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	110,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
3 INCARCATOR FRONTAL							
- ORE FUNCTIONARE	2	650,00	80,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
- ORE STATIONARE		504,00	16,00	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00
4 FREZA ZAPADA							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	100,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
5 AUTOBASCULANTA CU LAMA SI SARARITA							
- ORE FUNCTIONARE	5	1.625,00	100,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
- ORE STATIONARE		1.260,00	20,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
6 ASISTENTA TEHNICA							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	80,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
6 SARE (to)		608,530	225,00	136.919,25			136.919,25
7 NISIP (mc)		1.043,180	40,00	41.727,20			41.727,20
TOTAL CHELTUIELI				178.646,45	0,00	413.514,00	592.160,45

		Material	Manopera	Utilaj	Total
TOTAL		178.646,45	0,00	413.514,00	592.160,45
		MATER	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
TOTAL CHELT.DIRECTE I		178.646,45	0,00	413.514,00	592.160,45
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
C.A.S	300%				0
Acc.munca, boli prof.	242%				0
C.A.S.S.	200%				0
AJUTOR SOMAJ	500%				0
CCI	950%				0
Camera de munca	250%				0
Fond garantare	250%				0
TOTAL CHELT DIRECTE II		178.646,45	0,00	413.514,00	592.160,45
TOTAL INDIRECTE+PROFIT					60.696,45
DIN CARE :					
CHELTUIELI INDIRECTE	5,000%				29.608,02
PROFIT	5,000%				31.088,42
TOTAL					652.856,90
T.V.A. 20 %					130.571,38
TOTAL CU TVA					783.428,28

DEVIZ ESTIMATIV
DESZAPEZIRE 2016 -2017
BAZA 4, 43,200 km.

DENUMIRE	BUC.	CANT.	P/U	MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7
1 AUTOGREDER							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	110,00	0,00	0,00	35.750,00	**35.750,00**
2 BULDOZER PE SENILE							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	110,00	0,00	0,00	35.750,00	**35.750,00**
3 INCARCATOR FRONTAL							
- ORE FUNCTIONARE	2	650,00	80,00	0,00	0,00	52 000,00	**52.000,00**
- ORE STATIONARE		504,00	16,00	0,00	0,00	8.064,00	**8.064,00**
4 AUTOBASCULANTA CU LAMA SI SARARITA							
- ORE FUNCTIONARE	4	1.300,00	100,00	0,00	0,00	130.000,00	**130.000,00**
- ORE STATIONARE		1.008,00	20,00	0,00	0,00	20.160,00	**20.160,00**
5 ASISTENTA TEHNICA							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	80,00	0,00	0,00	26.000,00	**26.000,00**
6 SARE (to)		486,000	225,00	109.350,00			109.350,00
7 NISIP (mc)		833,130	40,00	33.325,20			33.325,20
TOTAL CHELTUIELI				142.675,20	0,00	307.724,00	450.399,20

		Material	Manopera	Utilaj	Total
TOTAL		142.675,20	0,00	307.724,00	450.399,20
		MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
TOTAL CHELT.DIRECTE I		142.675,20	0,00	307.724,00	450.399,20
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
C A S	800%				0
Acc munca, boli prof	242%				0
C.A.S.S.	200%				0
AJUTOR SOMAJ	500%				0
CCI	850%				0
Camera de munca	250%				0
Fond garantare	250%				0
TOTAL CHELT DIRECTE II		142.675,20	0,00	307.724,00	450.399,20
TOTAL INDIRECTE+PROFIT					46 165,92
DIN CARE :					
CHELTUIELI INDIRECTE	5,000%				22 519,96
PROFIT	5,000%				23 645,96
TOTAL					**496.565,12**
T.V.A. 20 %					99.313,02
TOTAL CU TVA					**595.878,14**

DEVIZ ESTIMATIV
DESZAPEZIRE 2016 -2017
BAZA 5, 60,410 km.

DENUMIRE	BUC.	CANT.	P/U	MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7
1 AUTOGREDER							
- ORE FUNCTIONARE	2	650,00	110,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
2 BULDOZER PE SENILE							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	110,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
3 INCARCATOR FRONTAL							
- ORE FUNCTIONARE	3	975,00	80,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
- ORE STATIONARE		756,00	16,00	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00
4 AUTOBASCULANTA CU LAMA SI SARARITA							
- ORE FUNCTIONARE	5	1.625,00	100,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
- ORE STATIONARE		1.260,00	20,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
5 ASISTENTA TEHNICA							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	80,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
6 SARE (to)		679,630	225,00	152.916,75			152.916,75
7 NISIP (mc)		1.165,050	40,00	46.602,00			46.602,00
TOTAL CHELTUIELI				199.518,75	0,00	411.046,00	610.564,75

		Material	Manopera	Utilaj	Total
TOTAL		199.518,75	0,00	411.046,00	610.564,75
		MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
TOTAL CHELT.DIRECTE I		199.518,75	0,00	411.046,00	610.564,75
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
C.A.S	300%				0
Acc.munca, boli prof	242%				0
C.A.S.S.	200%				0
AJUTOR SOMAJ	500%				0
CCI	350%				0
Camera de munca	250%				0
Fond garantare	250%				0
TOTAL CHELT DIRECTE II		199.518,75	0,00	411.046,00	610.564,75
TOTAL INDIRECTE+PROFIT					62.582,89
DIN CARE :					
CHELTUIELI INDIRECTE	5,000%				30.528,24
PROFIT	5,000%				32.054,65
TOTAL					673.147,64
T.V.A. 20 %					134.629,53
TOTAL CU TVA					807.777,16

DEVIZ ESTIMATIV
DESZAPEZIRE 2016 -2017
BAZA 6, 47,120 km

DENUMIRE	BUC.	CANT.	P/U	MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7
1 AUTOGREDER							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	110,00	0,00	0,00	35.750,00	**35.750,00**
2 BULDOZER PE SENILE							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	110,00	0,00	0,00	35.750,00	**35.750,00**
3 INCARCATOR FRONTAL							
- ORE FUNCTIONARE	2	650,00	80,00	0,00	0,00	52.000,00	**52.000,00**
- ORE STATIONARE		504,00	16,00	0,00	0,00	8.064,00	**8.064,00**
4 AUTOBASCULANTA CU LAMA SI SARARITA							
- ORE FUNCTIONARE	4	1 300,00	100,00	0,00	0,00	130 000,00	**130.000,00**
- ORE STATIONARE		1.008,00	20,00	0,00	0,00	20.160,00	**20.160,00**
5 ASISTENTA TEHNICA							
- ORE FUNCTIONARE	1	325,00	80,00	0,00	0,00	26.000,00	**26.000,00**
6 SARE (to)		530,100	225,00	119.272,50			119.272,50
7 NISIP (mc)		908,750	40,00	36.350,00			36.350,00
TOTAL CHELTUIELI				**155.622,50**	**0,00**	**307.724,00**	**463.346,50**

		Material	Manopera	Utilaj	Total
TOTAL		**155.622,50**	**0,00**	**307.724,00**	**463.346,50**
		MATER	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
TOTAL CHELT DIRECTE I		155.622,50	0,00	307.724,00	463.346,50
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
C A S	300%				0
Acc.munca, boli prof.	242%				0
C A.S.S.	200%				0
AJUTOR SOMAJ	500%				0
CCI	350%				0
Camera de munca	250%				0
Fond garantare	250%				0
TOTAL CHELT DIRECTE II		155.622,50	0,00	307.724,00	463.346,50
TOTAL INDIRECTE+PROFIT					47.493,02
DIN CARE :					
CHELTUIELI INDIRECTE	5,000%				23.167,33
PROFIT	5 000%				24 325,69
TOTAL					**510.839,52**
T V A 20 %					102.167,90
TOTAL CU TVA					**613.007,42**

DEVIZ ESTIMATIV
DESZAPEZIRE 2016 -2017
BAZA 1-6, 380,847 km.

DENUMIRE	BUC.	CANT.	P/U	MATER.	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7
1 AUTOGREDER							
- ORE FUNCTIONARE	10	3.250,00	110,00	0,00	0,00	357.500,00	**357.500,00**
2 BULDOZER PE SENILE							
- ORE FUNCTIONARE	6	1.950,00	110,00	0,00	0,00	214.500,00	**214.500,00**
3 INCARCATOR FRONTAL							
- ORE FUNCTIONARE	17	5.525,00	80,00	0,00	0,00	442.000,00	**442.000,00**
- ORE STATIONARE		4.284,00	16,00	0,00	0,00	68.544,00	**68.544,00**
4 FREZA ZAPADA							
- ORE FUNCTIONARE	2	650,00	100,00	0,00	0,00	65.000,00	**65.000,00**
4 AUTOBASCULANTA CU LAMA SI SARARITA							
- ORE FUNCTIONARE	31	10.075,00	100,00	0,00	0,00	1.007.500,00	**1.007.500,00**
- ORE STATIONARE		7.812,00	20,00	0,00	0,00	156.240,00	**156.240,00**
5 ASISTENTA TEHNICA							
- ORE FUNCTIONARE	6	1.950,00	80,00	0,00	0,00	156.000,00	**156.000,00**
6 SARE (to)		4.284,570	225,00	964.028,25			964.028,25
7 NISIP (mc)		7.344,910	40,00	293.796,40			293.796,40
TOTAL CHELTUIELI				**1.257.824,65**	**0,00**	**2.467.284,00**	**3.725.108,65**

		Material	Manopera	Utilaj	Total
TOTAL		**1.257.824,65**	**0,00**	**2.467.284,00**	**3.725.108,65**
		MATER	MANOP.	UTILAJ	TOTAL
TOTAL CHELT DIRECTE I		1.257.824,65	0,00	2.467.284,00	3.725.108,65
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
C.A.S	500%				0
Acc.munca, boli prof.	242%				0
C.A.S.S.	200%				0
AJUTOR SOMAJ	500%				0
CCI	850%				0
Camera de munca	250%				0
Fond garantare	250%				0
TOTAL CHELT DIRECTE II		1.257.824,65	0,00	2.467.284,00	3.725.108,65
TOTAL INDIRECTE+PROFIT					381.823,64
DIN CARE :					
CHELTUIELI INDIRECTE	5,000%				186.255,43
PROFIT	5.000%				195.568,20
TOTAL					**4.106.932,29**
T.V.A. 20 %					821.386,46
TOTAL CU TVA					**4.928.318,74**

ANEXA 7
la Hotărârea Consiliul Județean Ilfov
nr. ..... din data 2016

„Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzapezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului specific unei iernii calendaristice, respectiv 15.Noiembrie - 15.Martie
CONTRACT AFERENT IERNII CALENDARISTICE 2016 - 2017
RECAPITULARE VALORI

		VALORI ANUALE	
Nr. crt.	Denumire baza (lot)	Valoare anuala pe fiecare bază 25 TRECERI lei fără T.V.A.	Valoare anuala pe fiecare bază 25 TRECERI lei CU T.V.A.
1	BAZA 1	967.310,62	1.160.772,74
2	BAZA 2	806.212,50	967.455,00
3	BAZA 3	652.856,90	783.428,28
4	BAZA 4	496.565,12	595.878,14
5	BAZA 5	673.147,64	807.777,17
6	BAZA 6	510.839,52	613.007,42
TOTAL 6 BAZE:		**4.106.932,30**	**4.928.318,76**

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 4486 din 18.01 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.43/1997, republicată, modificată şi completată – privind regimul juridic al drumurilor, art.7 şi art.22, coroborate cu:

- prevederile art. 91, alin. (5), lit.a), pct.12, art. 97 din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, modificată şi completată,

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.638/1999 – privind aprobarea "Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice" şi a Normativului cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, anexa 1h, cuprinzand conţinutul-cadru al planurilor de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, art.1 şi art. 2 pct. 3 şi 5;

- prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr 289/2170/2013 – pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice"– indicativ AND 525-2013,

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, în calitate de administrator al reţelei de drumuri judeţene are sarcina de a asigura serviciile de întreţinere curentă pe timp de iarnă: "Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 ÷ 2017"

Avand în vedere Hotărarea de Guvern nr. 540/2000 – privind aprobarea încadrării în categoriile funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, JUDEŢUL ILFOV - CONSILIUL JUDEŢEAN deţine şi administrează o reţea de drumuri judeţene în lungime totală de aproximativ 381 de km, pe care este necesară intervenţia în cadrul serviciilor de întreţinere curentă pe timp de iarnă

Pentru achiziționarea serviciilor aferente Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV, pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 ÷ 2017, este necesar să se organizeze o

procedură de licitație deschisă pentru atribuirea contractului pe durata iernii calendaristice 2016 – 2017, respectiv pe perioada 15 11 2016 – 15 03 2017.

Necesitatea aprobării rezultă din organizarea procedurii de achiziție, astfel încât Județul Ilfov - Consiliul Județean să poată interveni la timp pentru a asigura un trafic normal, în condiții de iarnă, pe drumurile județene

În funcţie de zonele de intervenţie, precum si de rersursele proprii, pe raza administrativă a Consiliului Judeţean Ilfov, sunt stabilite 6 baze de acţionare, conform Propuneri baze - Baza I, II, III, IV, V și VI.

În vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi revin, Consiliul Județean Ilfov, în calitate de Autoritate Contractantă va încheia un contract pe durata iernii calendaristice 2016 - 2017, pentru bazele propuse. Pentru atribuirea contractului, se va organiza o procedură de licitație deschisă în anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, Secțiunea a 4-a, Paragraf I, art. 7, lit. b

Având în vedere cele precizate am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea "PROGRAMULUI DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA LUNECUŞULUI ŞI ÎNZĂPEZIRII PE DRUMURILE JUDEŢENE DIN JUDEŢUL ILFOV PE PERIOADA TIMPULUI NEFAVORABIL SPECIFIC IERNII 2016 - 2017" , conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, și nr 7, pe care le supunem spre dezbatere și adoptare Consiliului Județean Ilfov

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA INVESTIŢII
SERVICIUL LUCRĂRI
PUBLICE ŞI ACHIZIŢII

Nr. 7487 din 18.07 2016

Aprobat,
PREŞEDINTE,
Marian PETRACHE

RAPORT

Ţinand seama de prevederile Ordonanţei de Guvern nr.43/1997, republicată, modificată şi completată – privind regimul juridic al drumurilor, art.7 şi art.22, coroborată cu prevederile art 91, alin. (5), lit.a), pct.12, art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, modificată şi completată, Hotărarea de Guvern nr.638/1999 – privind aprobarea "Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice" şi a Normativului cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, anexa 1h, cuprinzand conţinutul-cadru al planurilor de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, art.1 şi art.2 pct 3 şi 5 cat şi prevederile Ordinului nr 289/2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice" – indicativ AND 525-2013, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, în calitate de administrator al reţelei de drumuri judeţene are sarcina de a asigura serviciile de întreţinere curentă pe timp de iarnă:" **Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 ÷ 2017 "**, conform anexelor nr 1, nr. 2, nr. 3, nr 4 nr. 5, nr. 6, şi nr. 7.

Avand în vedere Hotărarea de Guvern nr 540/2000 – privind aprobarea încadrării în categoriile funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV deţine şi administrează o reţea de drumuri judeţene în lungime totală de aproximativ 381 de km, pe care este necesară intervenţia în cadrul serviciilor de întreţinere curentă pe timp de iarnă. În funcţie de zonele de intervenţie, precum si de rersursele proprii , pe raza administrativă a Consiliului Judeţean Ilfov, sunt stabilite 6 baze de acţionare, conform **Propuneri baze- Baza I, II, III, IV, V şi VI.**

Pentru derularea în bune condiţii a fluenţei traficului vehiculelor de transport în comun, individuale şi de mărfuri pe timp de iarnă se va urmări realizarea următoarelor aspecte:

- menţinerea în permanenţă a suprafeţei drumurilor într-o stare netedă regulată, care să permită trecerea curentului de vant cu zăpada peste suprafaţa drumului;
- completarea cu indicatoare de circulaţie specifice semnalizării pe timp de iarnă pe drumurile ce necesită semnalizări suplimentare, precum şi montarea de parazăpezi;
- asigurarea utilajelor de intervenţie şi a personalului deservent necesar;
- asigurarea *stocurilor de materiale antiderapante (sare, nisip)* şi *de carburanţi* necesari cat şi depozitarea acestora;
- constituirea Comandamentului de deszăpezire şi a Grupei tehnice.

Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre analiză şi aprobare, prezentul raport privind serviciile de întreţinere curentă pe timp de iarnă: **" Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 ÷ 2017 "**, conform anexelor nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, și nr. 7.

DIRECȚIA GENERALA ECONOMICĂ, INVESTIȚII ȘI ABSORBȚIE FONDURI

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA INVESTIȚII
Constantin CĂLINOIU

SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE ȘI ACHIZIȚII
